


Nr.	Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Vorgänger	9							10. Aug '09							17. Aug '09							24. Aug '09							31. Aug '09							07. Sep '09							14. Sep '09							21. Sep '09							28. Sep '09							05. Okt '09							12. Okt '09							19. Okt '09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S									
1	18331	Betonarbeiten		41 Tage		Betonarbeiten																																																																																			
2	18331/1	Sauberkeitsschicht		9 Tage		Sauberkeitsschicht																																																																																			
3		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
4		V_ASU		0 Tage																																																																																					
5		Baugrube		0 Tage																																																																																					
6		Betonage		7 Tage		Betonage																																																																																			
7		Beton bestellen		0 Tage	4:3																																																																																				
8		Lieferfristen		5 Tage	7																																																																																				
9		Betonieren		5 Tage	5:8AA+2 Tage																																																																																				
10		Abbindefrist		5 Tage	9AA+2 Tage																																																																																				
11																																																																																									
12	18331/2	Fundamente, Bodenplatte		18 Tage		Fundamente, Bodenplatte																																																																																			
13		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
14		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																																					
15		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																																					
16		Sauberkeitsschicht		0 Tage																																																																																					
17		Schalen		5 Tage	16:13;14;15																																																																																				
18		Arbeits-, Dehn- und Randfugen einbauen		5 Tage	17AA+2 Tage																																																																																				
19		Ausparrungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	17AA+2 Tage																																																																																				
20		Einbauteile		9 Tage		Einbauteile																																																																																			
21		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																																					
22		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																																					
23		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																																					
24		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																																					
25		TGA-H/K/S/L/SP_GL_G		0 Tage																																																																																					
26		Einbauteile bestellen		0 Tage	13;14;21;22;23;24;25																																																																																				
27		Lieferfristen		5 Tage	26																																																																																				
28		Einbauteile einbauen		5 Tage	27AA+2 Tage;17AA+2 Tage																																																																																				
29		Bewehren		9 Tage		Bewehren																																																																																			
30		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																																					
31		TWP_SL_L	1	0 Tage																																																																																					
32		Stahl bestellen		0 Tage	30;31																																																																																				
33		Lieferfristen		5 Tage	32																																																																																				
34		Bewehren		5 Tage	33AA+2 Tage;17AA+2 Tage																																																																																				
35		Freigabe Bewehrung TWP		0 Tage	34AA+2 Tage																																																																																				
36		Betonage		11 Tage		Betonage																																																																																			
37		Beton bestellen		0 Tage	15																																																																																				
38		Lieferfristen		5 Tage	37																																																																																				
39		Betonieren	3	5 Tage	38AA+2 Tage;35;18EE;19EE;28EE																																																																																				
40		Nachbehandeln		10 Tage	39AA+2 Tage																																																																																				
41		Ausschallfristen		5 Tage	39AA+2 Tage																																																																																				
42		Ausschalen		5 Tage	41AA+2 Tage																																																																																				
43																																																																																									
44																																																																																									
45																																																																																									
46																																																																																									
47																																																																																									
48																																																																																									
49																																																																																									
50																																																																																									
51																																																																																									
52																																																																																									
53																																																																																									
54																																																																																									
55																																																																																									
56																																																																																									
57																																																																																									
58																																																																																									

Nr.	Nr.	Vorgangname	Notizen	Dauer	Vorgänger	10. Aug '09							17. Aug '09							24. Aug '09							31. Aug '09							07. Sep '09							14. Sep '09							21. Sep '09							28. Sep '09							05. Okt '09							12. Okt '09							19. Okt '09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
59	18331/3	Bodenplatten mit darunterliegender Perimeterdämmung		22 Tage		Bodenplatten mit darunterliegender Perimeterdämmung																																																																												
60		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																														
61		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																														
62		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																														
63		Sauberkeitsschicht		0 Tage																																																																														
64		Schalen		5 Tage	60;61;62;63																																																																													
65		Arbeits-, Dehn- und Randfugen einbauen		5 Tage	64AA+2 Tage																																																																													
66		Ausparrungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	64AA+2 Tage																																																																													
67		Perimeterdämmung		10 Tage																																																																														
68		Bestellung der Komponenten, Materialien, Stoffe		0 Tage	60;61																																																																													
69		Lieferfristen		5 Tage	68																																																																													
70		Perimeterdämmung verlegen		5 Tage	69AA+2 Tage;64AA+2 Tage																																																																													
71		Abdeckung (PE - Folie) verlegen		5 Tage	70AA+2 Tage																																																																													
72		Einbauteile		9 Tage																																																																														
73		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																														
74		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																														
75		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																														
76		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																														
77		TGA-H/K/S/L/SP_GL_G		0 Tage																																																																														
78		Einbauteile bestellen		0 Tage	73;74;75;76;77																																																																													
79		Lieferfristen		5 Tage	78																																																																													
80		Einbauteile einbauen	2	5 Tage	79AA+2 Tage;64AA+2 Tage																																																																													
81		Bewehren		13 Tage																																																																														
82		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																														
83		TWP_SL_L	1	0 Tage																																																																														
84		Stahl bestellen		0 Tage	82;83																																																																													
85		Lieferfristen		5 Tage	84																																																																													
86		Bewehren		5 Tage	85AA+2 Tage;71AA+2 Tage																																																																													
87		Freigabe Bewehrung TWP		0 Tage	86AA+2 Tage																																																																													
88		Betonage		15 Tage																																																																														
89		Beton bestellen		0 Tage	60;61																																																																													
90		Lieferfristen		5 Tage	89																																																																													
91		Betonieren	3	5 Tage	87;90AA+2 Tage;80EE;85EE;66EE																																																																													
92		Nachbehandeln		10 Tage	91AA+2 Tage																																																																													
93		Ausschalfen		5 Tage	91AA+2 Tage																																																																													
94		Ausschalen		5 Tage	93AA+2 Tage																																																																													
95																																																																																		
96																																																																																		
97																																																																																		
98																																																																																		
99																																																																																		
100																																																																																		
101																																																																																		
102																																																																																		
103																																																																																		
104																																																																																		
105																																																																																		
106																																																																																		
107																																																																																		
108																																																																																		
109																																																																																		
110																																																																																		
111																																																																																		
112																																																																																		
113																																																																																		
114																																																																																		
115																																																																																		
116																																																																																		

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Vorgänger	9							10. Aug '09							17. Aug '09							24. Aug '09							31. Aug '09							07. Sep '09							14. Sep '09							21. Sep '09							28. Sep '09							05. Okt '09							12. Okt '09							19. Okt '09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S									
117	18331/4	Ortbetonwand / Ortbetonstützen		23 Tage		Ortbetonwand / Ortbetonstützen																																																																																			
118		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
119		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																																					
120		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																																					
121		Wandaufleger (Decken, Fundamente..)		0 Tage																																																																																					
122		Schalung stellen		5 Tage	118;119;121;120																																																																																				
123		Aussparungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	122AA+2 Tage																																																																																				
124		Arbeits-, Dehn- und Randfugen einbauen		5 Tage	122AA+2 Tage																																																																																				
125		Einbauteile		9 Tage		Einbauteile																																																																																			
126		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																																					
127		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																																					
128		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																																					
129		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																																					
130		Einbauteile bestellen		0 Tage	126;127;128;129;118;119																																																																																				
131		Lieferfristen		5 Tage	130																																																																																				
132		Einbauteile einbauen	2	5 Tage	131AA+2 Tage;122AA+2 Tage	Bewehren																																																																																			
133		Bewehren		9 Tage		Bewehren																																																																																			
134		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																																					
135		TWP_SL_L	1	0 Tage																																																																																					
136		Stahl bestellen		0 Tage	134;135																																																																																				
137		Lieferfristen		5 Tage	136																																																																																				
138		Bewehren		5 Tage	137AA+2 Tage;122AA+2 Tage																																																																																				
139		Freigabe Bewehrung TWP		0 Tage	138AA+2 Tage																																																																																				
140		Schalung schliessen		5 Tage	139;123EE;132EE;124EE	Betonage																																																																																			
141		Betonage		16 Tage		Betonage																																																																																			
142		Beton bestellen		0 Tage	118;119																																																																																				
143		Lieferfristen		5 Tage	142																																																																																				
144		Betonieren		5 Tage	140;143AA+2 Tage																																																																																				
145		Nachbehandeln		10 Tage	144AA+2 Tage																																																																																				
146		Ausschallfristen		5 Tage	144AA+2 Tage																																																																																				
147		Ausschalen		5 Tage	146AA+2 Tage																																																																																				
148																																																																																									
149																																																																																									
150																																																																																									
151																																																																																									
152																																																																																									
153																																																																																									
154																																																																																									
155																																																																																									
156																																																																																									
157																																																																																									
158																																																																																									
159																																																																																									
160																																																																																									
161																																																																																									
162																																																																																									
163																																																																																									
164																																																																																									
165																																																																																									
166																																																																																									
167																																																																																									
168																																																																																									
169																																																																																									
170																																																																																									
171																																																																																									
172																																																																																									
173																																																																																									
174																																																																																									

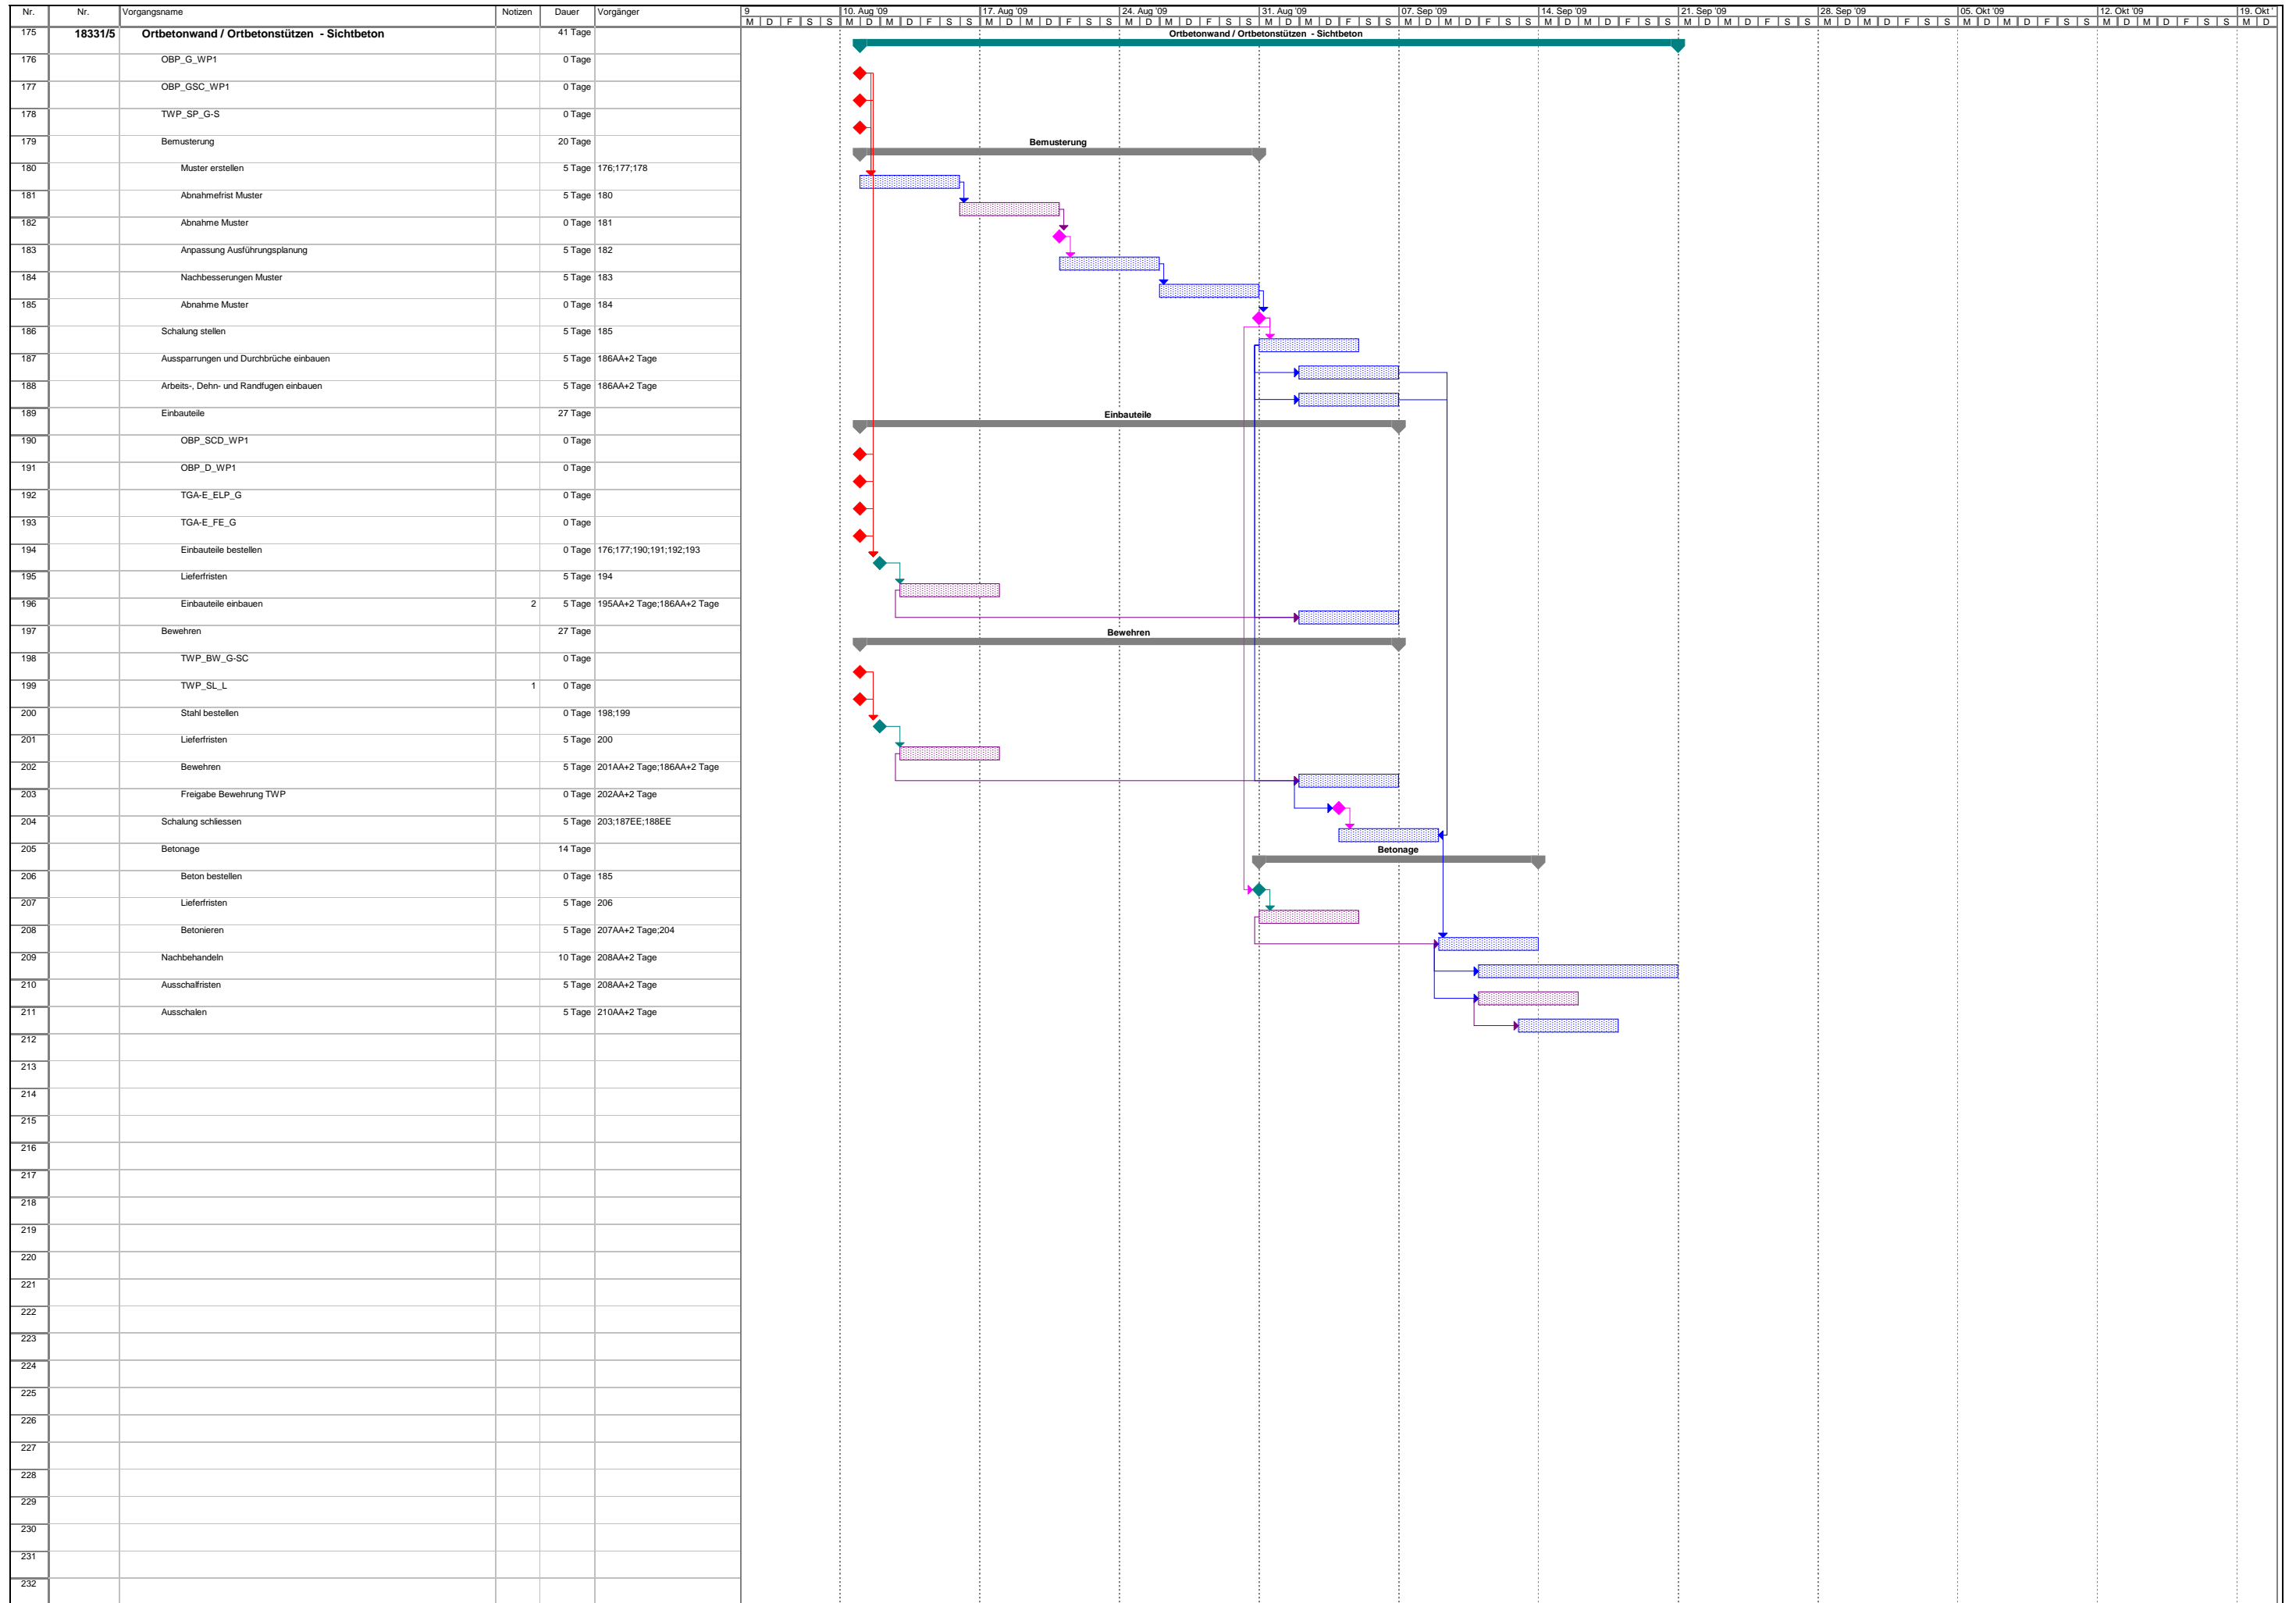

Nr.	Nr.	Vorgangname	Notizen	Dauer	Vorgänger	9							10. Aug '09							17. Aug '09							24. Aug '09							31. Aug '09							07. Sep '09							14. Sep '09							21. Sep '09							28. Sep '09							05. Okt '09							12. Okt '09							19. Okt '09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S									
233	18331/6	Ortbetondecken (Deckentische / Tafelschalung)		21 Tage		Ortbetondecken (Deckentische / Tafelschalung)																																																																																			
234		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
235		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																																					
236		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																																					
237		Deckenaufleger		0 Tage																																																																																					
238		Bodenplatte bzw. darunterliegende Decke		0 Tage																																																																																					
239		Schalung stellen		5 Tage	234;235;236;238;237																																																																																				
240		Randabschalungen		5 Tage	239AA+2 Tage																																																																																				
241		Aussparungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	239AA+2 Tage																																																																																				
242		Arbeits-, Dehn- und Randfugen einbauen		5 Tage	239AA+2 Tage																																																																																				
243		Einbauteile		9 Tage																																																																																					
244		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																																					
245		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																																					
246		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																																					
247		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																																					
248		Einbauteile bestellen		0 Tage	234;235;244;245;246;247																																																																																				
249		Lieferfristen		5 Tage	248																																																																																				
250		Einbauteile einbauen	2	5 Tage	239AA+2 Tage;249AA+2 Tage																																																																																				
251		Bewehren		12 Tage																																																																																					
252		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																																					
253		TWP_SL_L	1	0 Tage																																																																																					
254		Stahl bestellen		0 Tage	252;253																																																																																				
255		Lieferfristen		5 Tage	254																																																																																				
256		Bewehren		5 Tage	239AA+2 Tage;255AA+2 Tage																																																																																				
257		Freigabe Bewehrung TWP		0 Tage	256AA+2 Tage																																																																																				
258		Betonage		14 Tage																																																																																					
259		Beton bestellen		0 Tage	234;235																																																																																				
260		Lieferfristen		5 Tage	259																																																																																				
261		Betonieren	3	5 Tage	260AA+2 Tage;257;241EE;250EE;240;242EE																																																																																				
262		Nachbehandeln		10 Tage	261AA+2 Tage																																																																																				
263		Ausschallfristen		5 Tage	261AA+2 Tage																																																																																				
264		Ausschalen		5 Tage	263AA+2 Tage																																																																																				
265																																																																																									
266																																																																																									
267																																																																																									
268																																																																																									
269																																																																																									
270																																																																																									
271																																																																																									
272																																																																																									
273																																																																																									
274																																																																																									
275																																																																																									
276																																																																																									
277																																																																																									
278																																																																																									
279																																																																																									
280																																																																																									
281																																																																																									
282																																																																																									
283																																																																																									
284																																																																																									
285																																																																																									
286																																																																																									
287																																																																																									
288																																																																																									
289																																																																																									
290																																																																																									

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Vorgänger	9							10. Aug '09							17. Aug '09							24. Aug '09							31. Aug '09							07. Sep '09							14. Sep '09							21. Sep '09							28. Sep '09							05. Okt '09							12. Okt '09							19. Okt '09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S									
291	183317	Unter- und Überzüge, Balken, Stürze, Binder		23 Tage		Unter- und Überzüge, Balken, Stürze, Binder																																																																																			
292		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
293		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																																					
294		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																																					
295		Schalung stellen		5 Tage	292;293;294																																																																																				
296		Aussparungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	295AA+2 Tage																																																																																				
297		Arbeits-, Dehn- und Randfugen einbauen		5 Tage	295AA+2 Tage																																																																																				
298		Einbauteile		9 Tage																																																																																					
299		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																																					
300		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																																					
301		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																																					
302		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																																					
303		Einbauteile bestellen		0 Tage	292;293;299;300;301;302																																																																																				
304		Lieferfristen		5 Tage	303																																																																																				
305		Einbauteile einbauen	2	5 Tage	295AA+2 Tage;304AA+2 Tage																																																																																				
306		Bewehren		9 Tage																																																																																					
307		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																																					
308		TWP_SL_L	1	0 Tage																																																																																					
309		Stahl bestellen		0 Tage	307;308																																																																																				
310		Lieferfristen		5 Tage	309																																																																																				
311		Bewehren		5 Tage	295AA+2 Tage;310AA+2 Tage																																																																																				
312		Freigabe Bewehrung TWP		0 Tage	311AA+2 Tage																																																																																				
313		Schalung schliessen		5 Tage	296EE;305EE;312;297EE																																																																																				
314		Betonage		16 Tage																																																																																					
315		Beton bestellen		0 Tage	292;293																																																																																				
316		Lieferfristen		5 Tage	315																																																																																				
317		Betonieren		5 Tage	313;316AA+2 Tage																																																																																				
318		Nachbehandeln		10 Tage	317AA+2 Tage																																																																																				
319		Ausschallfristen		5 Tage	317AA+2 Tage																																																																																				
320		Ausschalen		5 Tage	319AA+2 Tage																																																																																				
321																																																																																									
322																																																																																									
323																																																																																									
324																																																																																									
325																																																																																									
326																																																																																									
327																																																																																									
328																																																																																									
329																																																																																									
330																																																																																									
331																																																																																									
332																																																																																									
333																																																																																									
334																																																																																									
335																																																																																									
336																																																																																									
337																																																																																									
338																																																																																									
339																																																																																									
340																																																																																									
341																																																																																									
342																																																																																									
343																																																																																									
344																																																																																									
345																																																																																									
346																																																																																									
347																																																																																									
348																																																																																									

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Vorgänger	9							10. Aug '09							17. Aug '09							24. Aug '09							31. Aug '09							07. Sep '09							14. Sep '09							21. Sep '09							28. Sep '09							05. Okt '09							12. Okt '09							19. Okt '09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
349	18331/8	Treppen		23 Tage		Treppen																																																																																			
350		OBP_G_WP1		0 Tage		Treppen																																																																																			
351		OBP_GSC_WP1		0 Tage		Treppen																																																																																			
352		TWP_SP_G-S		0 Tage		Treppen																																																																																			
353		Schalung stellen		5 Tage	350;351;352	Treppen																																																																																			
354		Anschlussbewehrung freilegen		5 Tage	353AA	Treppen																																																																																			
355		Aussparungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	353AA+2 Tage	Treppen																																																																																			
356		Einbauteile		9 Tage		Einbauteile																																																																																			
357		OBP_SCD_WP1		0 Tage		Einbauteile																																																																																			
358		OBP_D_WP1		0 Tage		Einbauteile																																																																																			
359		TGA-E_ELP_G		0 Tage		Einbauteile																																																																																			
360		TGA-E_FE_G		0 Tage		Einbauteile																																																																																			
361		Einbauteile bestellen		0 Tage	350;351;357;358;359;360	Einbauteile																																																																																			
362		Lieferfristen		5 Tage	361	Einbauteile																																																																																			
363		Einbauteile einbauen	2	5 Tage	353AA+2 Tage;362AA+2 Tage	Einbauteile																																																																																			
364		Bewehren		11 Tage		Bewehren																																																																																			
365		TWP_BW_G-SC		0 Tage		Bewehren																																																																																			
366		TWP_SL_L	1	0 Tage		Bewehren																																																																																			
367		Stahl bestellen		0 Tage	365;366	Bewehren																																																																																			
368		Lieferfristen		5 Tage	367	Bewehren																																																																																			
369		Bewehren		5 Tage	353AA+2 Tage;354;368AA+2 Tage	Bewehren																																																																																			
370		Freigabe Bewehrung TWP		0 Tage	369	Bewehren																																																																																			
371		Betonage		16 Tage		Betonage																																																																																			
372		Beton bestellen		0 Tage	350;351	Betonage																																																																																			
373		Lieferfristen		5 Tage	372	Betonage																																																																																			
374		Betonieren		5 Tage	373AA+2 Tage;370	Betonage																																																																																			
375		Nachbehandeln		10 Tage	374AA+2 Tage	Betonage																																																																																			
376		Ausschallfristen		5 Tage	374AA+2 Tage	Betonage																																																																																			
377		Ausschalen		5 Tage	376AA+2 Tage	Betonage																																																																																			
378						Betonage																																																																																			
379	18331/9	Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken		7 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
380		OBP_G_WP1		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
381		OBP_GSC_WP1		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
382		OBP_SCD_WP1		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
383		OBP_D_WP1		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
384		TWP_SP_G-S		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
385		TWP_BW_G-SC		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
386		TWP_SL_L		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
387		TGA-E_ELP_G		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
388		TGA-E_FE_G		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
389		Fundamente bzw. Decken		0 Tage		Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
390		Bestellung der Fertigteile		0 Tage	380;381;382;383;384;385;386;387;	Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
391		Lieferfristen		5 Tage	390	Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
392		Einbau der Fertigteile		5 Tage	391AA+2 Tage;389	Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
393						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
394						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
395						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
396						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
397						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
398						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
399						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
400						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
401						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
402						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
403						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
404						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
405						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			
406						Fertigteile: Wandelemente, Stützen, Pfeiler, Unterzüge, Überzüge, Binder, Balken																																																																																			

Nr.	Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Vorgänger	9							10. Aug 09							17. Aug 09							24. Aug 09							31. Aug 09							07. Sep 09							14. Sep 09							21. Sep 09							28. Sep 09							05. Okt 09							12. Okt 09							19. Okt 09						
						M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S									
407	18331/10	Fertigteil - Plattendecke		21 Tage		Fertigteil - Plattendecke:																																																																																			
408		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
409		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																																					
410		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																																					
411		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																																					
412		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																																					
413		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																																					
414		TWP_SL_L		0 Tage																																																																																					
415		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																																					
416		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																																					
417		Deckenaufleger		0 Tage																																																																																					
418		Bestellung der Fertigteile		0 Tage	408;409;410;411;412;413;414;415;																																																																																				
419		Lieferfristen		5 Tage	418																																																																																				
420		Einbau der Decken		5 Tage	417;419AA+2 Tage																																																																																				
421		Ortbetonergänzung		21 Tage		Ortbetonergänzung																																																																																			
422		Randabschalungen		5 Tage	420AA+2 Tage																																																																																				
423		Ausparrungen und Durchbrüche einbauen		5 Tage	420AA+2 Tage																																																																																				
424		Arbeits-, Dehn- und Randfugen einbauen		5 Tage	420AA+2 Tage																																																																																				
425		Bewehren		12 Tage		Bewehren																																																																																			
426		Stahl bestellen	1	0 Tage	414																																																																																				
427		Lieferfristen		5 Tage	426																																																																																				
428		Bewehren		5 Tage	427AA+2 Tage;420AA+2 Tage																																																																																				
429		Betonage		14 Tage		Betonage																																																																																			
430		Beton bestellen		0 Tage																																																																																					
431		Lieferfristen		5 Tage	430																																																																																				
432		Betonieren		5 Tage	431AA+2 Tage;428AA+2 Tage;422AA+2 Tage;423EE;424EE;432AA+2 Tage																																																																																				
433		Nachbehandeln		10 Tage																																																																																					
434		Ausschallfristen		5 Tage	432AA+2 Tage																																																																																				
435		Ausschalen		5 Tage	434AA+2 Tage																																																																																				
436																																																																																									
437	18331/11	Fertigteil - Treppen		7 Tage		Fertigteil - Treppen																																																																																			
438		OBP_G_WP1		0 Tage																																																																																					
439		OBP_GSC_WP1		0 Tage																																																																																					
440		OBP_SCD_WP1		0 Tage																																																																																					
441		OBP_D_WP1		0 Tage																																																																																					
442		TWP_SP_G-S		0 Tage																																																																																					
443		TWP_BW_G-SC		0 Tage																																																																																					
444		TWP_SL_L		0 Tage																																																																																					
445		TGA-E_ELP_G		0 Tage																																																																																					
446		TGA-E_FE_G		0 Tage																																																																																					
447		Treppenaufleger		0 Tage																																																																																					
448		Bestellung der Fertigteile		0 Tage	438;439;440;441;442;443;444;445;																																																																																				
449		Lieferfristen		5 Tage	448																																																																																				
450		Einbau der Treppenelemente		5 Tage	447;449AA+2 Tage																																																																																				
